STRATÉGIE DE TEST
PROJET TOMSEN

1. Scénarios prévus

La campagne se divise en scénarios de nouvelles fonctionnalités (répartis par sprint) et en scénarios de non-régression. (24 cas de tests au total.)

Sprint 1 et 2 : Authentification, connexion

- **SC-01 : Création de compte utilisateur :** Vérifier création avec données valides, âge et sécurité.
  [Typologie : Moyen (4 cas)]
- **SC-02 : Gestion des pièces justificatives :** Vérifier upload, formats refusés, taille dépassée.
  [Typologie : Moyen (4 cas)]
- **SC-03 : Authentification et 2FA :** Vérifier accès direct, challenge 2FA et rejets.
  [Typologie : Moyen (3 cas)]
- **SC-04 : Authentification biométrique :** Vérifier appel natif OS.

  [Typologie : Simple (1 cas)]

Sprint 3 : Récupération de données (BDF)

- **SC-05 : Interconnexion BDF :** Vérifier affichage et rafraîchissement.

  [Typologie : Moyen (3 cas)]

Sprint 4 : Consultation

- **SC-06 : Téléchargement des relevés :** Vérifier téléchargement PDF sans stockage serveur.
  [Typologie : Simple (1 cas)]
- **SC-07 : Consultation des transactions :** Vérifier affichage dynamique repliable.

  [Typologie : Simple (2 cas)]

Sprint 5 : Suivi de consommation

- **SC-08 : Suivi de consommation :** Vérifier graphique et répartition dépenses.

  [Typologie : Moyen (2 cas)]

Sprint 6 : Conseiller virtuel

- **SC-09 : Conseiller virtuel :** Vérifier redirection prise de rendez-vous.

  [Typologie : Simple (1 cas)]

Campagne de Non-Régression (TNR)

- **SC-NR-01 : Parcours critique :** Vérifier création compte jusqu'à affichage solde.

  [Typologie : Moyen (Automatisé)]

2. Méthodes de test adaptées et Évaluation

Conformément aux objectifs d'efficacité, de maîtrise de la charge (estimée à 44h) et des ressources, le choix des méthodes a été évalué pour éviter d'avoir du « tout-automatisé » qui peut être coûteux à maintenir sur des fonctionnalités en cours de développement.

Tests Manuels & Exploratoires (IHM) - Sprints 1 à 6

- **Objectif :** Valider l'ergonomie, la conformité aux maquettes et l'UI sur les environnements Desktop et Mobiles.
- **Avantages / Inconvénients :** Très économique et rapide à mettre en place pour tester de nouvelles fonctionnalités (aucun script à coder). Inconvénient : chronophage si on l'utilise pour la non-régression complète.
- **Expertise et Charge :** Consultant QA. Coût d'entrée faible.

Tests d'API (via Postman) - Sprints 1 à 3

- **Objectif :** Valider de façon isolée les briques SECU et Banque de France (BDF).
- **Pour / Contre :** Exécution ultra-rapide et ciblage précis (sécurité HTTPS, gestion des Timeouts). L'inconvénient est que cela ne teste pas l'interface visuelle.
- **Ressources :** Consultant QA, avec l'aide du Tech Lead pour la configuration des mocks.

Tests Automatisés (via Cypress) - Restreint à la TNR

- **Objectif :** Sécuriser exclusivement le parcours critique en fin de projet.
- **Justification :** L'automatisation est limitée à 10 % (le parcours vital) pour respecter le budget temps (44h).

  Créer des scripts automatisés pendant les Sprints 1 à 6 serait contre-productif, car l'interface va évoluer et casser les tests.

  On automatise uniquement le cœur une fois stabilisé.


- **Ressources :** Consultant QA. L'effort initial de création du script sera rentabilisé, car il servira de filet de sécurité pour les futures mises à jour de l'application.

3. Ressources, Environnements et Charge

- **Ressources humaines** : 1 Consultant QA, Alice / Tech Lead.
- **Environnements cibles :** Desktop (Chrome/Safari) et Mobile (iOS/Android) pour la biométrie et les justificatifs.
- **Outils QA :** Postman, Cypress, Xray/Squash TM.
- **Données :** Création des jeux d'essai par le QA, Staging avec BDD réinitialisable.

Charge de travail estimée (Abaque) : Conception (11h) + Exécution (33h) = 44 heures (env. 6 jours/homme).

4. Planning et Étapes clés

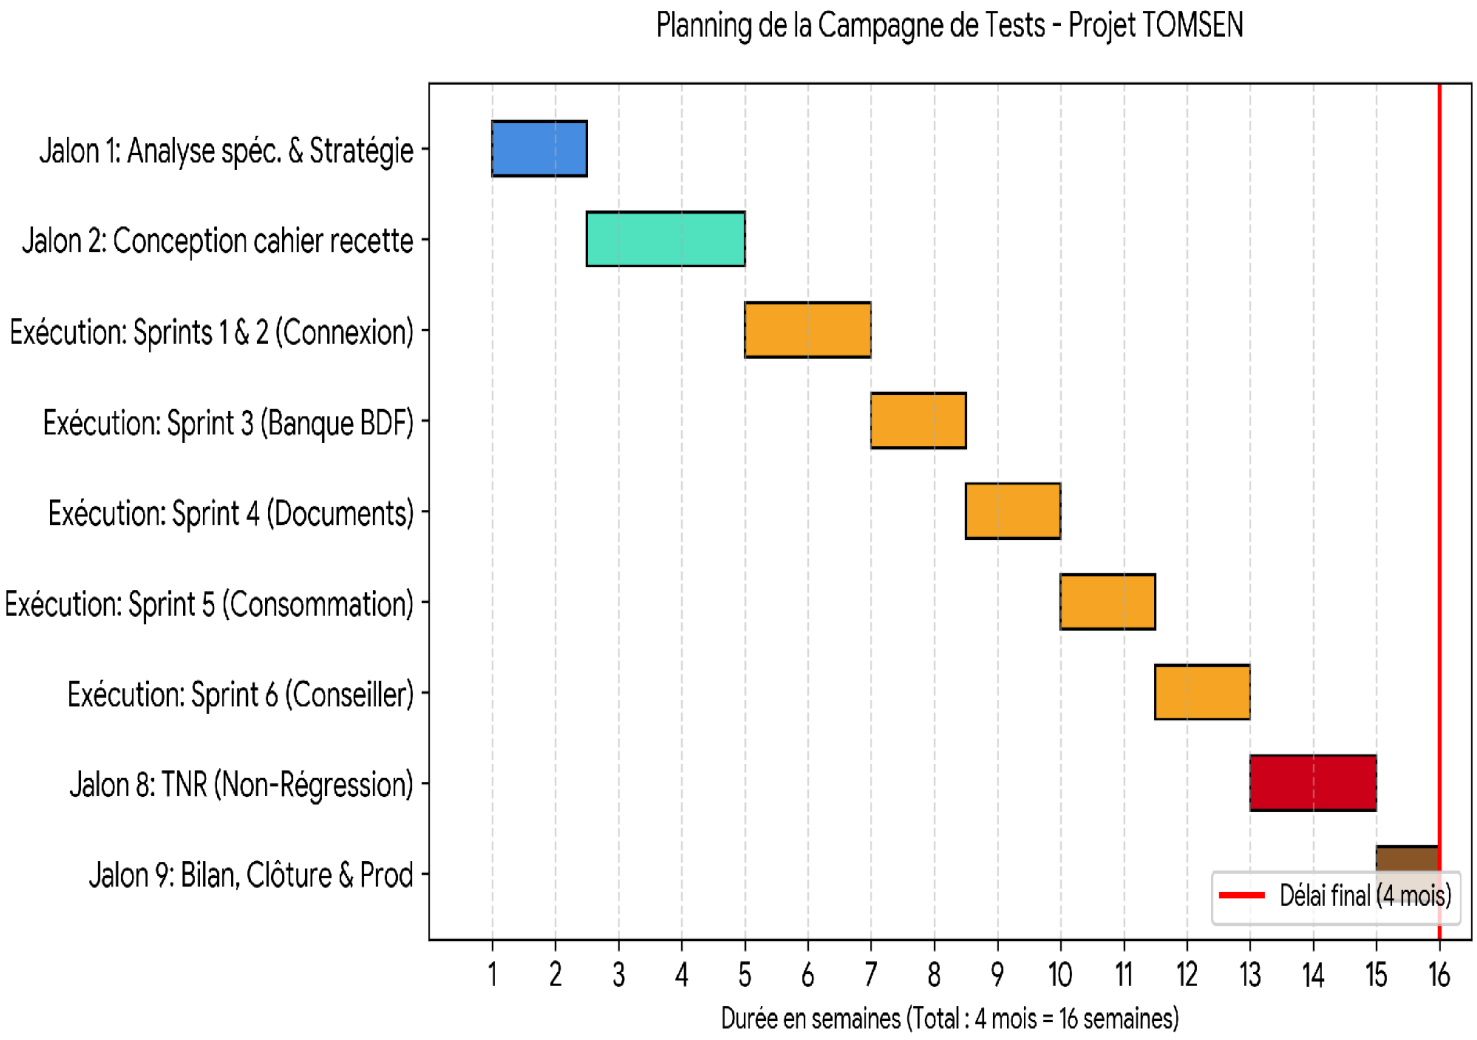

Jalon 1 : Analyse des spécifications et Stratégie de test – Durée : 1,5 semaine.

Jalon 2 : Conception du cahier de recette – Durée : 2,5 semaines.

Jalon 3 : Exécution Sprints 1 & 2 (Authentification, connexion) – Durée : 2 semaines.

Jalon 4 : Exécution Sprint 3 (Récupération des données) – Durée : 1,5 semaine.

Jalon 5 : Exécution Sprint 4 (Documents et transactions) – Durée : 1,5 semaine.

Jalon 6 : Exécution Sprint 5 (Suivi de consommation) – Durée : 1,5 semaine.

Jalon 7 : Exécution Sprint 6 (Conseiller virtuel) – Durée : 1,5 semaine.

Jalon 8 : Campagne de Non-Régression (TNR) – Durée : 2 semaines.

Jalon 9 : Bilan de campagne et Go/No-Go mise en production – Durée : 1 semaine.

5. Déroulement type d'une itération (Sprint)

1. Préparation (15 %) : Mise à jour du cahier de recette, création des données et mocks.

2. Exécution (50 %) : Lancement des tests manuels (IHM) et d'API sur Staging.

3. Remontée de bugs (15 %) : Création des tickets d'anomalies en temps réel.

4. Validation (20 %) : Re-tests suite aux corrections, passe rapide, et GO final.

6. Conditions de sortie de Sprint (Validation QA)

Cette matrice définit les critères d'acceptation (Minimum requis) pour valider une itération, ainsi que ce qui est une anomalie bloquant la livraison (NO-GO) et une anomalie acceptable qui seront à peaufiner lors du sprint suivant (GO avec réserves).

Sprint & Périmètre	**🎯 Minimum Requis (Critères d'acceptation)**	**⛔ NO-GO (Bloquant / Refus de sprint)**	**✅ GO avec réserves**
Sprint 1 : Création de compte [CRITIQUE]	• Création effective en BDD. • Contrôles d'âge respectés. • Format de mot de passe fort exigé.	• Inscription impossible. • Contournement de la limite d'âge autorisé.	• Défaut d'alignement des champs IHM. • Faute de frappe dans l'aide.
Sprint 2 : Auth, 2FA & Pièces [CRITIQUE]	• Connexion réussie et stable. • 2FA obligatoire. • Biométrie fonctionnelle sur Mobile. • Upload de justificatifs sécurisé.	• Bypass du 2FA possible. • Mot de passe transmis en clair (GET). • Upload malveillant non bloqué.	• Message d'erreur d'upload mal formaté. • Transition saccadée.
Sprint 3 : Interconnexion BDF [CRITIQUE]	• Appel API chiffré (HTTPS). • Récupération exacte des soldes. • Gestion propre des timeouts (pas de crash).	• Appels en HTTP clair (Violation Sécu). • Solde erroné ou vide. • Crash complet si Timeout > 30s.	• Animation de chargement (loader) absente. • Léger délai d'affichage (< 5s).

Sprint 4 : Transactions & PDF [MAJEUR]	• Téléchargement du relevé PDF opérationnel. • Liste des opérations consultable et dépliable.	• Erreur 404 sur le PDF. • Transactions impossibles à dérouler.	• Marges ou polices décalées sur le PDF. • Libellé très long qui dépasse du cadre.
Sprint 5 : Graphique Conso [MAJ/MIN]	• Graphique généré et visible. • Calculs de répartition exacts. • Filtres de date fonctionnels.	• Calculs mathématiques faux. • Crash de l'app dû au volume d'historique.	• Couleurs non conformes à la charte. • Temps de tri des dates un peu lent.
Sprint 6 : Conseiller virtuel [MINEUR]	• Redirection réussie vers le module externe.	• Lien mort (404) ou inactif.	• Bulle d'aide masquant une partie du footer.
Campagne TNR : Parcours Vital [CRITIQUE]	• 100% de succès sur le script automatisé.	• Régression détectée sur l'authentification ou BDF.	• AUCUN. Tolérance Zéro sur le parcours vital.

7. Préconisations et Points d'alerte

Cette section répertorie les alertes majeures identifiées lors de l'analyse, nécessitant des arbitrages pour garantir le respect du planning et la qualité du projet.

1. Risque Planning (Équipe tierce)

- 📌 **Constat :** Ajout de code externe prévu en fin de projet au moment de la TNR.
- ⚠️ **Risque (pourquoi/impact):** Effet tunnel et régressions en cascade qui risquent de faire dépasser le délai des 4 mois.
- ✅ **Action requise :** Le PO doit exiger une livraison anticipée en Staging (dès le Sprint 5).

2. Dépendance Environnement / API

- 📌 **Constat :** Les tests critiques dépendent des API SECU et Banque de France.
- ⚠️ **Risque (pourquoi/impact):** Sans API ni mocks disponibles, l'équipe QA sera bloquée et tout le planning sera retardé.
- ✅ **Action requise :** Le Tech Lead (Alice) doit garantir la stabilité des mocks dès le Sprint 1.

3. Alerte Sécurité (HTTP)

- 📌 **Constat :** Appels API en HTTP clair et mots de passe transmis en méthode GET.
- ⚠️ **Risque (pourquoi/impact):** Faille de sécurité critique (interception des données, non-conformité RGPD) et refus de mise en production.

- ✅ **Action requise :** Imposer le protocole HTTPS, interdire le GET pour les mots de passe et utiliser un token d'authentification (JWT).

4. Contradiction Architecturale (Historique)

- 📌 **Constat :** Le graphique demande l'historique global, mais le stockage BDD est interdit.
- ⚠️ **Risque (pourquoi/impact):** Ralentissements majeurs (timeouts) et saturation des quotas d'appels API.
- ✅ **Action requise :** Le PO doit trancher : autoriser un cache temporaire en BDD ou réduire l'analyse (ex: 30 derniers jours).
